



solutions >



CALENDRIER SOLUTION

1	2	3	4	5
JOUR DE LA SEMAINE	DATE		MÉTIERS	CASES À COLORIER
Dimanche	1-avr	WE		
Lundi	2-avr		Maçons	
Mardi	3-avr		Maçons	
Mercredi	4-avr		Maçons	
Jeudi	5-avr		Maçons	
Vendredi	6-avr		Maçons	
Samedi	7-avr	WE		
Dimanche	8-avr	WE		
Lundi	9-avr	Férié: lundi de Pâques		
Mardi	10-avr		Maçons	
Mercredi	11-avr		Maçons	
Jeudi	12-avr		Maçons	
Vendredi	13-avr		Maçons	
Samedi	14-avr	WE		
Dimanche	15-avr	WE		
Lundi	16-avr		Maçons	
Mardi	17-avr		Couvreurs	
Mercredi	18-avr		Couvreurs	
Jeudi	19-avr		Couvreurs	
Vendredi	20-avr		Couvreurs	
Samedi	21-avr	WE		
Dimanche	22-avr	WE		
Lundi	23-avr		Menuisiers	
Mardi	24-avr		Menuisiers	
Mercredi	25-avr		Instal. sanit et chauffage	
Jeudi	26-avr		Instal. sanit et chauffage	
Vendredi	27-avr		Electriciens	
Samedi	28-avr	WE		
Dimanche	29-avr	WE		
Lundi	30-avr	Pont		



Maçon

> Rouge



Inst sanit et chauffage

> Bleu foncé



Plafonneurs

> Brun



Couvreurs

> Orange



Électriciens

> Mauve



Carreleurs

> Noir



Menuisiers

> Bleu Clair



Chapiste

> Rose



Nettoyage



> Gris

METHODE CALENDRIER

1	2	3	4	5
JOUR DE LA SEMAINE	DATE		MÉTIERS	CASES À COLORIER
Mardi	1-mai	Férié: fête du travail		
Mercredi	2-mai		Electriciens	
Jeudi	3-mai		Chapistes	
Vendredi	4-mai		Séchage de la chape	
Samedi	5-mai	WE	Séchage de la chape	
Dimanche	6-mai	WE	Séchage de la chape	
Lundi	7-mai		Séchage de la chape	
Mardi	8-mai		Séchage de la chape	
Mercredi	9-mai		Séchage de la chape	
Jeudi	10-mai		Plafonneurs	
Vendredi	11-mai		Plafonneurs	
Samedi	12-mai	WE		
Dimanche	13-mai	WE		
Lundi	14-mai		Plafonneurs	
Mardi	15-mai		Carreleurs	
Mercredi	16-mai		Carreleurs	
Jeudi	17-mai	Férié: Ascension		
Vendredi	18-mai	Pont		
Samedi	19-mai	WE		
Dimanche	20-mai	WE		
Lundi	21-mai		Carreleurs	
Mardi	22-mai		Electriciens	
Mercredi	23-mai		Instal. sanit et chauffage	
Jeudi	24-mai		Instal. sanit et chauffage	
Vendredi	25-mai		Menuisiers	
Samedi	26-mai	WE		
Dimanche	27-mai	WE		
Lundi	28-mai	Férié; lundi de Pentecôte		
Mardi	29-mai		Menuisiers	
Mercredi	30-mai		Nettoyage	
Jeudi	31-mai			

Le chantier devrait se terminer le 30 mai.

LIGNE DU TEMPS SOLUTION

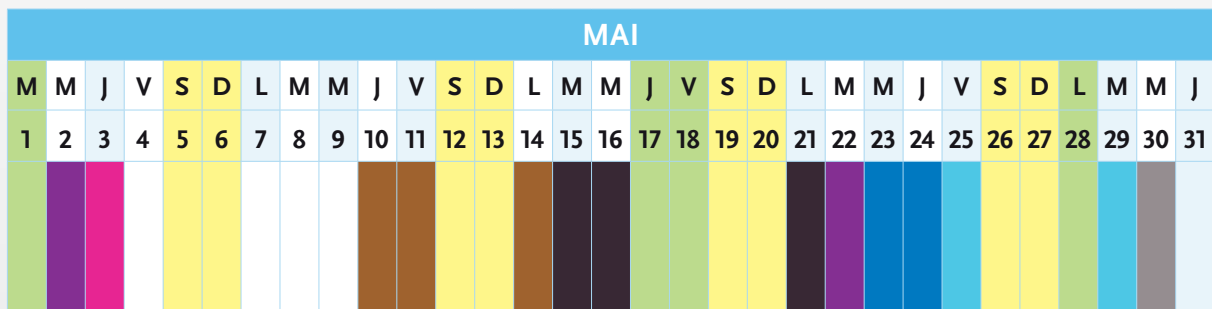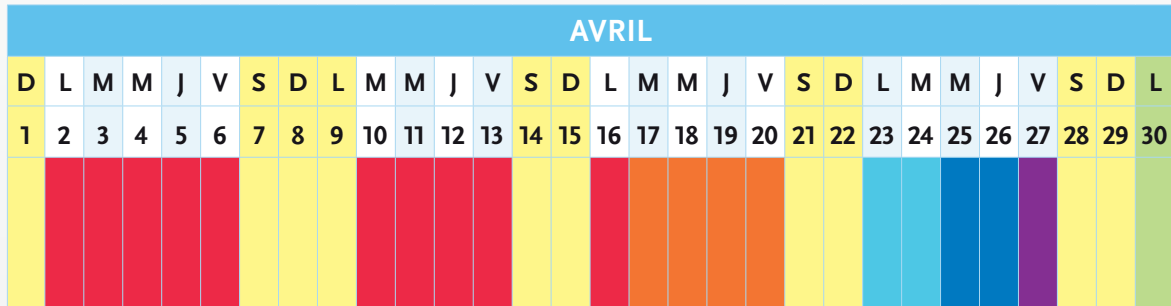

Le chantier devrait se terminer le 30 mai.

- | | | | | | |
|---|--------------|--|----------|---|--------------|
| ● Maçon | > Rouge | ● Couvreur | > Orange | ● Menuisiers | > Bleu Clair |
| ● Inst sanit et chauffage | > Bleu foncé | ● Électriciens | > Mauve | ● Chapiste | > Rose |
| ● Plafonneurs | > Brun | ● Carreleurs | > Noir | ● Nettoyage | > Gris |
